

Fecha:

No.

1

CONTRATO C.O.P.-099-2020-P

CHIHUAHUA, CHIH.

10/DICIEMBRE/2020

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE OBRA REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADOS EN: 1) EL RETORNO VIRGAS LUJA, EN LA AVENIDA OCTAVIO PAZ, EL RETORNO JOSE FUENTES MARES DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) LA AVENIDA TEOTIHUACAN, LA AVENIDA MONTE ALBAN DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL PAQUINE EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, Y 3) LA AVENIDA ROBERTO FIERRO LA CALLE FRANCISCO SARABIA DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, COMPLEJO Y PARQUES PROPIEDAD DE PRODECH.

LOS TRABAJOS ESTARAN A CARGO DE INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A DE C.V. BAJO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-099-2020-P. CON UN MONTO DE \$ 4,269,715.86 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 86/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SE HACE MENCION QUE PARA INICIO DE LOS TRABAJOS SE OTORGO UN 30% DEL MONTO DEL CONTRATO SIENDO LA CANTIDAD DE \$ 1,425,861.12 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA PRESENTE SERVIRA PARA LLEVAR UN REGISTRO DE LOS ACONTECIMIENTOS MAS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, COMO SON: CAMBIOS EN EL PROYECTO, VARIACION DE VOLUMETRIA, AJUSTE O MODIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS REGISTRO Y AUTORIZACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS O FUERA DE CATALOGO. EL PROGRAMA PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA: INICIO 7 DICIEMBRE 2020 AL 08 ABRIL 2021 (120 DIAS NATURALES) PERSONAS AUTORIZADAS PARA HACER ANOTACIONES REFERENTES A LA EJECUCION DE LA OBRA.

CONTRATISTA

CONTRATANTE

ING. RICARDO CARBANAL CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA
INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE

ING. LUISITO DOMINGUEZ S.
SUPERVISOR DE OBRA
PRODECH.



ING. NIDIA PARRA ANTONILON B.
ADMINISTRADOR UNICO
INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE.

ING. MANUEL CRISTOFORO TREVIÑO CH.
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA
OPERACION Y MANTENIMIENTO
PRODECH.

Fecha:

No. 2


Nota No 1 15/DICIEMBRE/2020
SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVE. ROBERTO FIERRO PARQUE INDUSTRIAL DE ROPOERTO, CON LA DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE LA CUAL NO VIENE CONTEMPLADA DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS POR LO CUAL SE GENERARA UN PRECIO EXTRAORDINARIO SIENDO LA CANTIDAD A CONSIDERAR DE 34.00 METROS LINEALES.

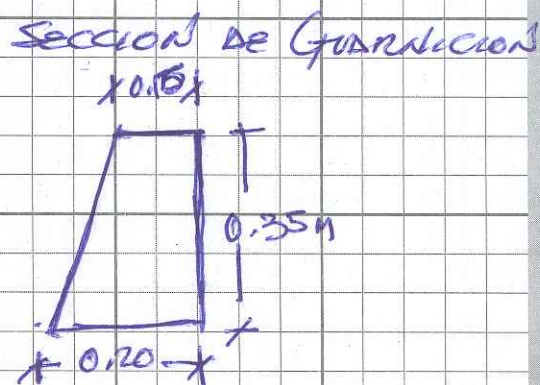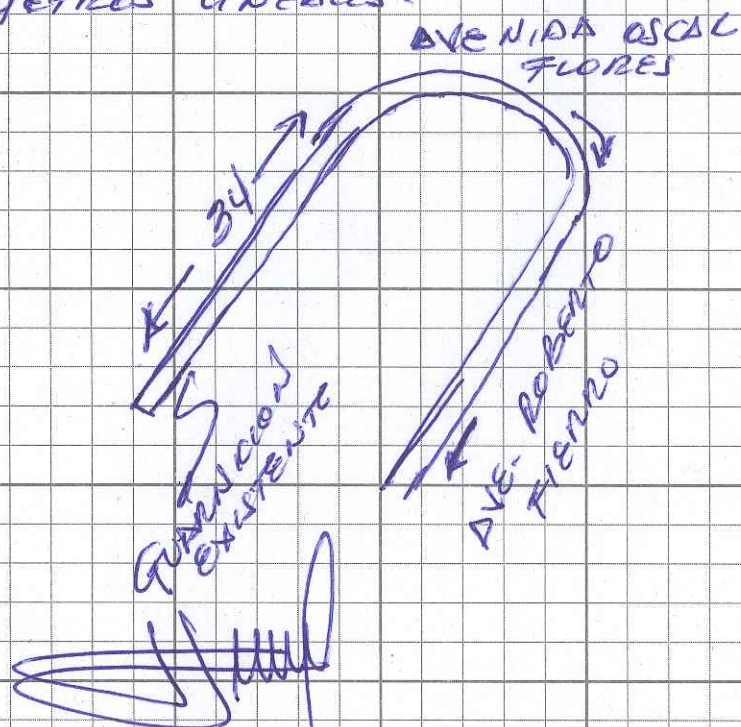

Nota No 2

16/DICIEMBRE/2020




SE INICIA CON TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACION EN EXCAVACION PARA COLADO DE GUARNICION DE SECCION (0.20x0.15x0.40 M) EN AVENIDA ROBERTO FIERRO POR ACCESO A BOULEVARD OSCAR FLORES.



Nota No 3

15/DICIEMBRE/2020

SE LLEVA A CABO COLADO DE GUARNICION EN ACCESO POR BLVD. OSCAR FLORES CON CONCRETO PREMEZCLADO - FC- 200 KG/CM2 CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE ADECUADA PARA LLEVAR A CABO EL MISMO.




Fecha:

No. 3

Nota No 4

17/DICIEMBRE/2020

SE INICIA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AVE. ROBERTO FIERRO POR ACCESO DE AVENIDA TECNOLÓGICO, CONSISTENTES EN DEMOLICION Y CORTE EN CARPETA EXISTENTE GENERANDO UNA AREA DE 10 M^2

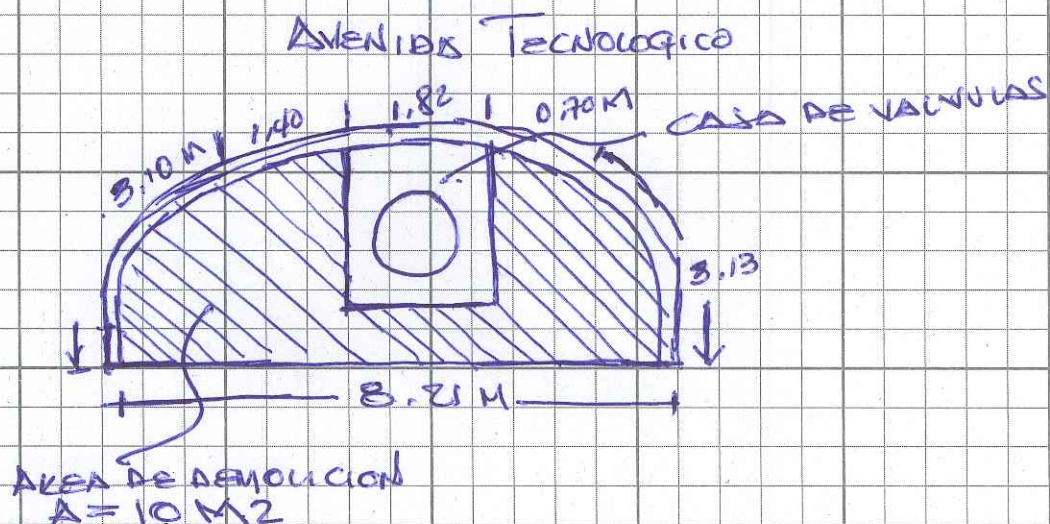

Nota No 5

18/DICIEMBRE/2020

CON ESTA TECHA SE REALIZA COLADO DE GUARNICION CON CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA $F'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ CON UNA TEMPERATURA ADECUADA PARA EL COLADO DE LA M^3 -MA.

Nota No 6


19/DICIEMBRE/2020

EL DIA DE HOY SE LLEVA A CABO COLADO DE FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA $F'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ ARMADO CON MALLA DE REFUERZO (MALLA ELECTROSOLDADA $6 \times 6 / 4-4$)

Nota No 7

19/DICIEMBRE/2020

EL DIA DE HOY SE LLEVA A CABO COLADO DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA $6 \times 6 - 4/4$ Y CONCRETO M^3 -45.

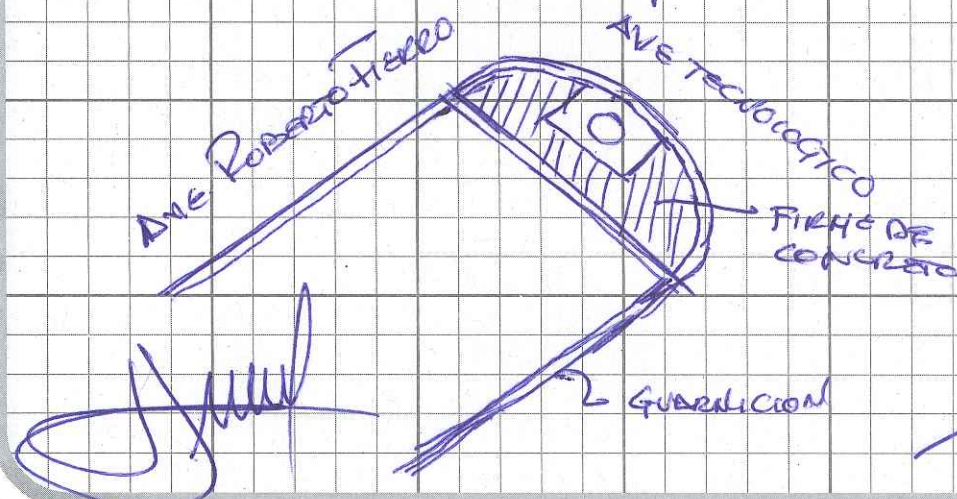

Fecha:

No.

4

NOTA No 8

21/DICIEMBRE/2020



CON ESTA FECHA SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA EL RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.




NOTA No 9

23/DICIEMBRE/2020

CON ESTA FECHA SE INICIA CON RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CONCRETO ASFALTICO (CARPETA) CON UN ESPESOR DE 2 CMS DE ESPESOR INICIANDO POR ACCESO DE AVENIDA TECNOLÓGICO-ROBERTO FIERRE CON UN ANCHO DE 7.80 M AL PASAR LA GUARNICION QUE SE COLOCO NOUEVAMENTE SE CIERRA LA EXTENDEDO-RA DE ASFALTO A UN ANCHO DE 7.00 M RESPETANDO EL ANCHO DE PROYECTO Y ESPECIFICADO EN PLANO.

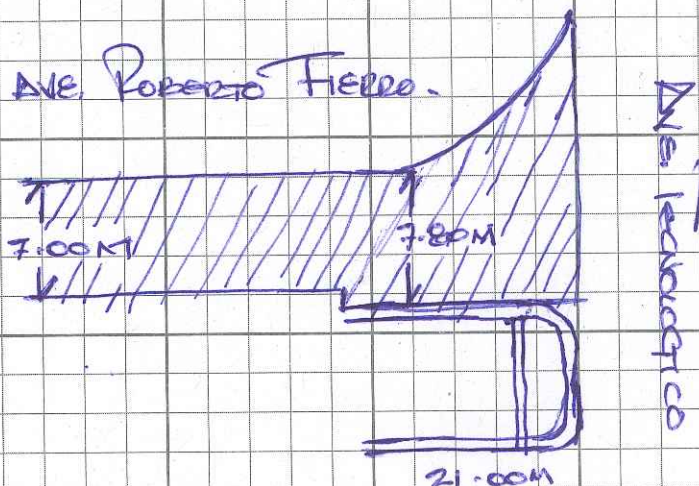
NOTA No 10

28/DICIEMBRE/2020

CON ESTA FECHA SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA QUE DEBEA DE INFORMAR CON ANTICIPACION EL TENDIDO DE LA CARPETA PARA COMUNICARSELOS A LOS USUARIOS Y HAGAN SE PRO-GRAMACION DE ACTIVIDADES POR CIERRE TEMPORAL EN EL TENDIDO DE LA MISMA.







NOTA No 11

28/DICIEMBRE/2020

CON ESTA FECHA SE LLEGA AL ACUERDO QUE SE CUBRA EL ANCHO TOTAL DE LA CAUSE YA QUE ESTA MIDE 7.60 METROS PROMEDIO GENERANDO UN VOLUMEN EXCEDENTE.



Fecha:


No.

5

NOTA No 12

29/DICIEMBRE/2020


CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO EN AVENIDA ROBERTO FIERRO Y CALLE FRANCISCO SARABIA DE PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.



NOTA No 13

30/DICIEMBRE/2020


SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE CANCELO EL TRABAJO DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA YA QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NO SON FAVORABLES YA QUE LA TEMPERATURA QUE LE PRESENTO FUE DE 0°C (CERO GRADOS CENTIGRADOS) ESTO DEBIDO A LA RECOMENDACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, ESTOS SE REANUBARAN CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS LO PERMITAN.



NOTA No 14

07/ENERO/2021



HOY SE REANUBAN LOS TRABAJOS DE BACHEO, RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN SENTIDO O CUERPO DE AVENIDA ROBERTO FIERRO ENTRE AV. TECNOLÓGICO HACIA OSCAR FLORES DANDOLOS POR TERMINADOS EN ESTE TRAMO E INICIANDO EN EL OTRO SENTIDO DE OSCAR FLORES HACIA AVENIDA TECNOLÓGICO LLEGANDO HASTA LA CALLE FRANCISCO SARABIA.



NOTA No 15

08/ENERO/2021

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA PLENIO AVISO A ESTA SUPERVISION Y A USUARIOS DEL PARQUE, LLEVANDOSE A CABO EL TENDIDO DE CARPETA EN EL AREA TOTAL DE LA CALLE.



Fecha:

No.

6

Nota No 16

9/ENERO/2021

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BACHEO, RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2 CUS COMPACTOS EN AVENIDA ROBERTO FIERRO EN EL SENTIDO DE DE BLVD. OSCAR FLORES HACIA AVENIDA TECNOLÓGICO EN PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.

Nota No 17

10/ENERO/2021

SE INFORMA QUE SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DEBIDO A LA FALTA DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR. ESPERANDO REANUDAR EN CUANTO SE NORMAUCE EL SUMINISTRO DE ASFALTO MODIFICADO PG 70-22.

Nota No 18

14/ENERO/2021

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE BACHEO RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN EL CUERPO DE AVENIDA ROBERTO FIERRO EN EL SENTIDO DE BLVD. OSCAR FLORES HACIA AVENIDA TECNOLÓGICO EJECUTANDOSE LOS M² (METROS CUADRADOS) QUE VIENEN CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

Nota No 19

15/ENERO/2021

SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO GENERADOS DEL BACHEO, RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CARPETA PARA CONCLUSION DE LOS MISMOS.

Nota No 20

26/ENERO/2021

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSAS PARA RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CASAS DE VALVULAS EN CALE RETORNO VARGAS UOSA DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.


Fecha:

No. 7

Nota 21

27/ENERO/2021


CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO EL ARMADO DE LOSAS PARA TAPAS Y BROCALES DE CAJAS DE VALVULAS Y POZOS DE VISITA CON ACERO DE $3/8"$ @ 10 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y LONGITUDINALMENTE, COLOCACION DE CONTRAMARCO FABRICADO CON CANAL DE ACERO DE 4", EN POZO DE VISITA SE COLOCA TAPA O BROCAL NUEVO DE HIERRO DUCTIL, EN CABA DE VALVULAS SE RECUPERA TAPA EXISTENTE DE FIERRO FUNDIDO A LA VEZ SE REALIZA COLADO DE AMBAS LOSAS DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA RESISTENCIA $F'_{CC} = 200 \text{ KG/CM}^2$.



Nota No 22

02 FEBRERO/2021


SE CONTINUA CON LA DEMOLICION Y LIMPIEZA DE CASA DE CABA DE VALVULAS EN CADENAMIENTO 0+178 Y POZO DE VISITA EN CADENAMIENTO 0+218 DE CALLE VARGAS LLOSA EN COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.



Nota No 23

02 FEBRERO/2021



SE REALIZA ARMADO DE LOSAS PARA CAJAS DE VALVULAS Y BROCAL DE POZO DE VISITA, EL ACERO PARA LAS LOSAS DE CAJAS ES $3/8"$ @ 10 CMS Y ARMYEX DE 4 PUNTAS $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ CONTRAMARCO CON CANAL DE 4" EN POZOS DE VISITA EN LA CABA DE VALVULAS SE CONSIDERA CAMBIAR LA TAPA EXISTENTE POR ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES Y EN POZO DE VISITA SE REUTILIZA LA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA POR ESTAR EN BUENAS CONDICIONES EL CONCRETO ES HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA $F'_{CC} = 200 \text{ KG/CM}^2$



Nota No 24

08/FEBRERO/2021

CON ESTA FECHA SE REALIZA DEMOLICION Y LIMPIEZA DE LOSA EN CABA DE VALVULAS UBICADA EN CADENAMIENTO 0+183 EN LA AVENIDA OCTAVIO PAZ Y POZOS DE VISITA EN EL CADENAMIENTO 0+280 Y 0+357 EN RETORNO FUENTES MARES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.



Fecha:

No.

8

NOTA No 25

9/FEBRERO/2021

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO ARMADO DE LOSAS SEGUN PROYECTO, SE REEMPLAZA BROCAL DE POZO DE VISITA EN LA AVENIDA OCTAVIO PAZ Y LA TAPA DE LA CAJA DE VALVULAS SE CAMBIA POR UNA DE FOTO YA QUE LA EXISTENTE ES DE PLASTICO. EN EL RETORNO FUENTES MARES SE COLOCAN BROCALES NUEVOS DE HIERRO DUCTIL PARA POZOS DE VISITA Y SE LLEVA A CABO COLADO DE LOSAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA $f'_{ic} = 200 \text{ kg/cm}^2$.



NOTA No 26

10/FEBRERO/2021


SE REALIZA TRABAJOS DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2CMS. COMPACTOS EN CALLE VARGAS LLOSA CON UNA LONGITUD DE 328 MTS Y UN ANCHO DE 11.25 MTS ARROSANDO UNA SUPERFICIE DE 3700 M².



NOTA No 27

11/FEBRERO/2021



CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VARGAS LLOSA POR LO CUAL SE TRASLADA MAQUINARIA HACIA LA AVENIDA OCTAVIO PAZ PARA INICIAR CON EL BACHEO Y TENDIDO EN ESTA AVENIDA EN EL SENTIDO DE LEON TOLSTOI HACIA AVENIDA TECNOLÓGICO CUBRIENDOSE UNA SUPERFICIE DE 3600 M² YA QUE DICHO SENTIDO DE CIRCULACION ES DE 10.5 M DE ANCHO Y UNA LONGITUD DE 337 M².



NOTA No 28

12/FEBRERO/2021

EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN SENTIDO DE TECNOLÓGICO HACIA LEON TOLSTOI DE LA AVENIDA OCTAVIO PAZ CUBRIENDOSE UNA SUPERFICIE SIMILAR A LA ~~AREA~~ QUE SE HACE MENCION EN LA NOTA ANTERIOR.



Fecha:

No.


9

NOTA No 29

12/FEBRERO/2021

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO EXCAVACION, CORTE DE CARPETA Y RETIRO DE MATERIAL (BASE) EN UN ESPESOR DE 0.20 MTS UBICADOS EN EL RETORNO FUENTES MARES CADENAMIENTOS 0+000 CON UN ANCHO DE 8.60 X 17.44 MTS DE LONGITUD. Y ~~0+196~~ 0+196 CON UN ANCHO DE 4.21 X 9.50 MTS. LA CAPA RETRADA SE SUSTITUYO CON MATERIAL DE G.C.C. BASE CON UN TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" Y COMPACTADO AL 98%.







DYE OCTAVIO PAZ

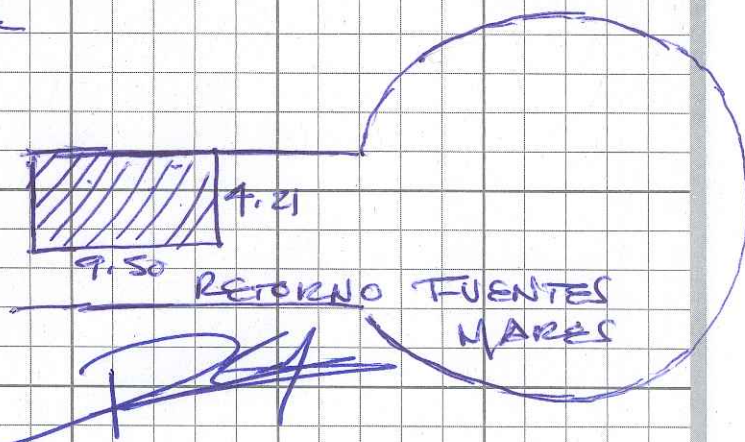

NOTA No 30

13/FEBRERO/2021

SE LLEVA A CABO TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE 2 CMS COMPACTES EN RETORNO JOSE FUENTES MARES CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 2445 M²

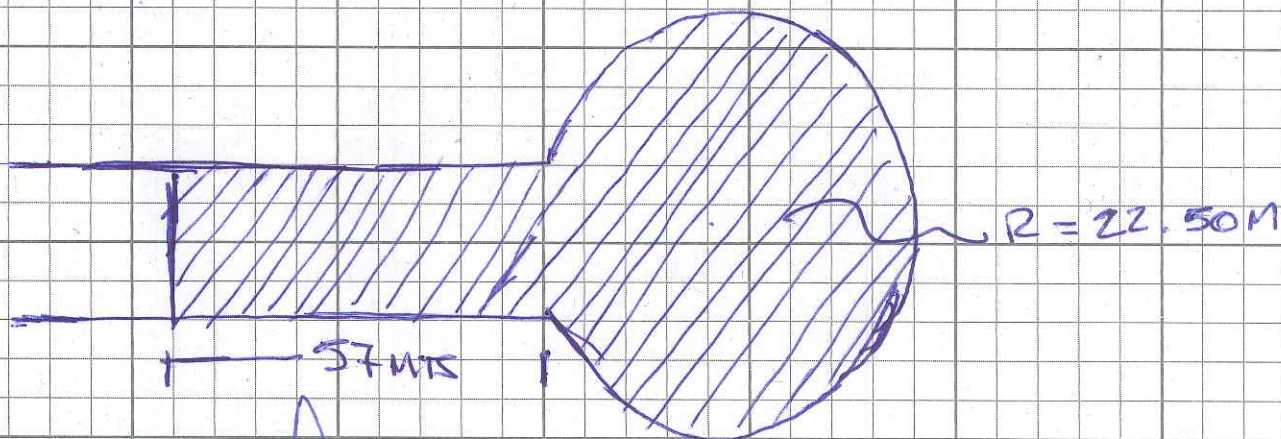


Fecha:

No. 10

NOTA No 31

13/FEBRERO/2021

CON ESTA FECHA SE COCCE CARPETA DE T.M. A $3/4$ EN LOS CADENAMIENTOS 0+000 Y 0+196 DONDE SE DEPIISO LA PRIME-
LA CAPA (BASE) CON MATERIAL TRITURADO DE G.C.C. DE $1\frac{1}{2}$ "
EL ESPESOR DE LA CARPETA FUE DE 7CMS.

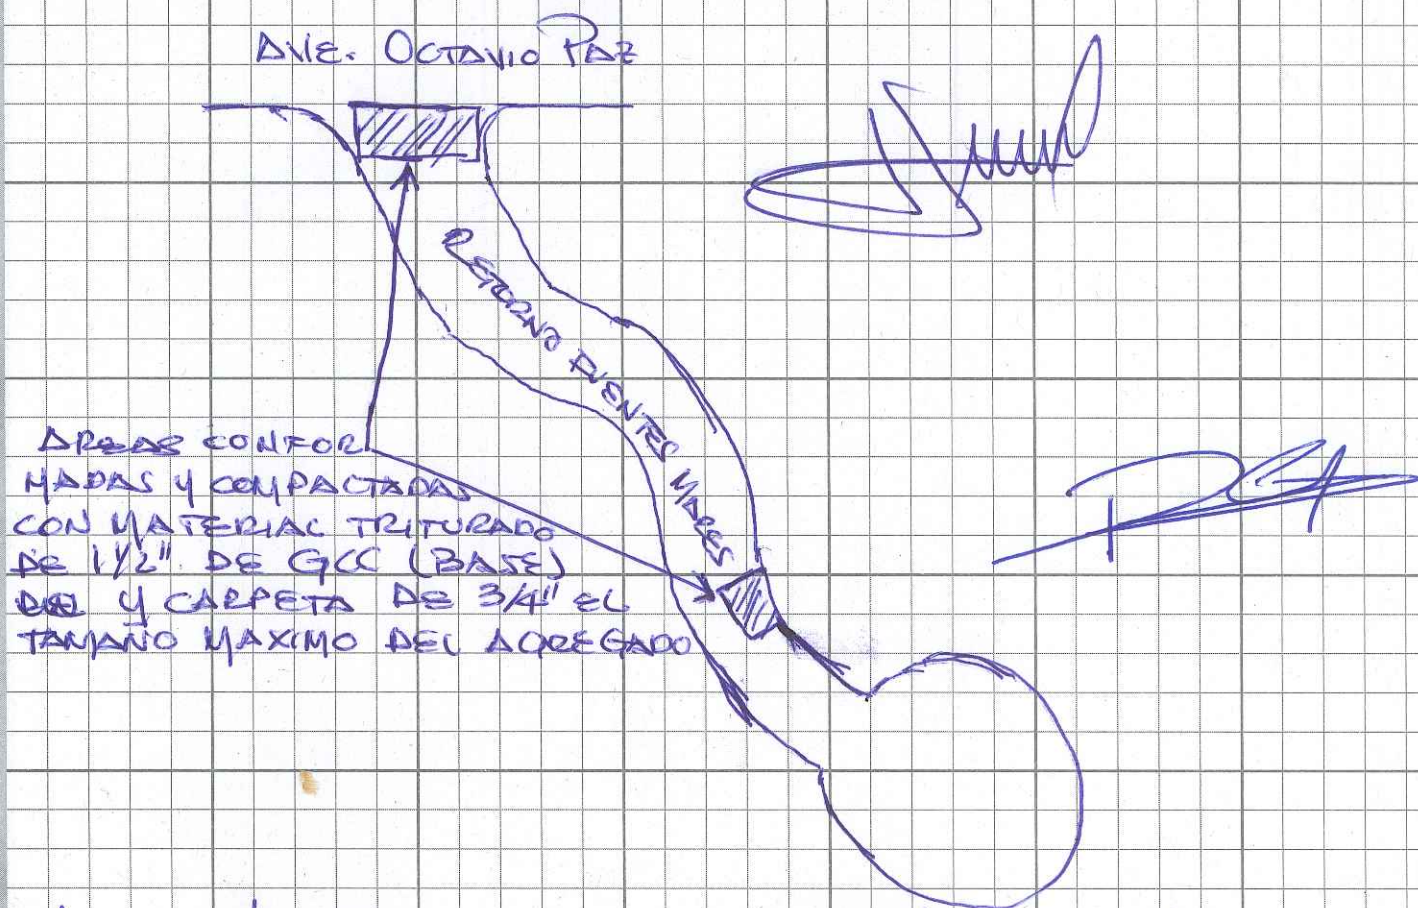

NOTA No 32


23/FEBRERO/2021

CON ESTA FECHA SE ASIGNA TRAMO COMPRENDIDO EN AVE-
NIDA OCTAVIO PAZ PARA COMPLETAR VOLUMEN CONSIDERADO
EN CATALOGO DE CONCEPTOS SIENDO ESTE DEL CADENAMIENTO
0+878 AL 1+328 DE LA AVENIDA TECNOLÓGICO
HACIA RETORNO FUENTES MARES DANDO LAS SIGUIENTES
MEDIDAS ANCHO DE CALE 21.00 MTS Y UNA LONGITUD
DE 450 MTS.

NOTA No 33

24/FEBRERO/2021

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA OCTAVIO PAZ DEL CADENAMIENTO 0+878 AL
1+328

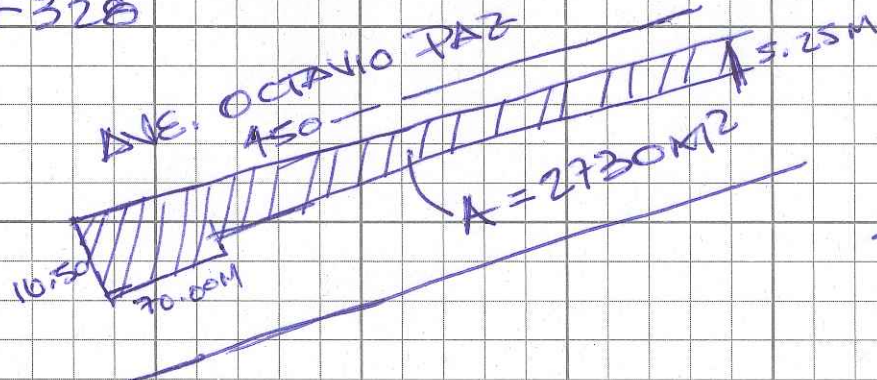

Fecha:


No.

11

NOTA No 34

26/FEBRERO/2021


SE CONTINUA CON TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE 2 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN AVENIDA OCTAVIO PAZ COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

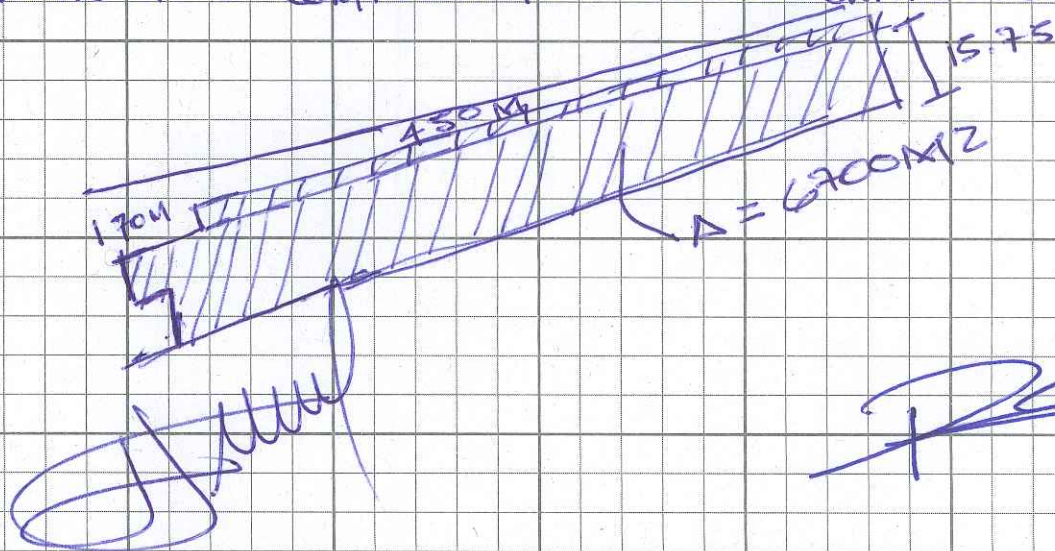

NOTA No 35

27/FEBRERO/2021

HOY SE LLEVA A CABO TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE 2CMS. COMPACTA EN EL RETORNO FUENTES MARES CON EL AREA DE COMPRENDIDA EN EL RETORNO SE CUMPLE CON LA SUPERFICIE QUE VIENE CONSIDERADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS LA CUAL ES DE 29,000 M²

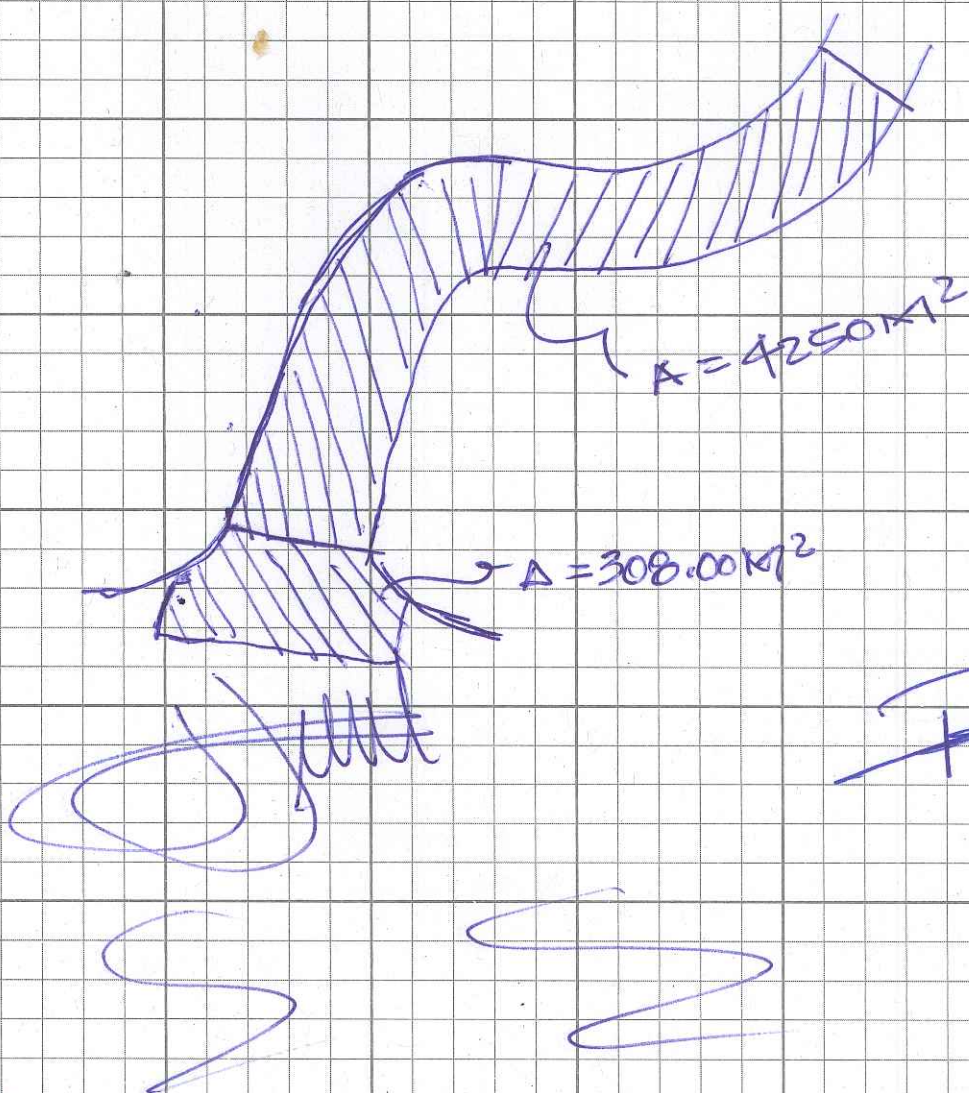

Fecha:

No.

Nota No 36

10/MARZO/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIO CON, BACHEO, RIEGO DE LUGA Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE 2 CMS. COMPACTOS EN PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME



Nota No 38

16/MARZO/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIERON POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE BACHEO, RIEGO DE LUGA Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDAS TEOTIHUACAN Y MONTE ALBAN DEL PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME. POR LO CUAL SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Q.O.P. - 09-2020-P.

