

**SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENOMINADO**

CAMPUS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PIDET/SPARK

**CALLE METALMECÁNICA Y CALLE AUTOMOTRIZ, LOTE 1 DE LA
MANZANA XII, PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL
CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIH.**

**BITACORA DE OBRA
TOMO X**



**VALUACIÓN Y SERVICIOS
INTEGRADOS S.A. DE C.V.**

**CALLE ALLENDE No. 502-A COLONIA CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. (614) 416-1646 Y 415-0650**

**supervisionvsi@gmail.com
vsichihuahua.com**

BITÁCORA DE OBRA


FECHA / /

Nº 290

NOTA # 739.

6 DE JULIO DEL 2021.




EL DIA DE HOY SUPERVISION DESOCUPA LA OFICINA MOVIL DEL CAMPAMENTO Y SE INSTALA PROVISIONALMENTE EN EL AREA COMUN DEL COMEDOR EN EL EDIFICIO.



NOTA # 740.

10 DE JULIO DEL 2021.

SE INFORMA QUE AL DIA DE HOY LA CONTRATISTA AUN NO ENTREGA LOS PLANOS "AS-BUILT" A SUPERVISION PARA SU REVISION Y VALIDACION. SE RECUERDA QUE ESTE ES ALCANCE DE SUPERVISION, PERO NO PUEDE LIEVARSE A CABO HASTA NO CONTAR CON LOS PLANOS. SE SOLICITA EL APOYO DE PRODECH PARA PRESIONAR A LA CONTRATISTA.




NOTA Nº 741

12 DE JULIO DE 2021

CON ESTA FECHA SE CONSTATA LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO.

- 3 ELECTRICOS EN AREA DE SUBESTACION.




NOTA Nº 742

19 DE JULIO DE 2021

CON ESTA FECHA SE CONSTATA LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO:

- 3 ELECTRICOS EN AREA DE SUBESTACION



BITÁCORA DE OBRA


FECHA / /

Nº 291

NOTA Nº 743

20 DE JULIO DE 2021

EN RELACION A LA NOTA Nº 731, LA CONTRATISTA DEBE DE SOLICITAR LA INFORMACION QUE REQUIERA PARA SOLVENTAR LA CON LOS RESPONSABLES DEL DISEÑO Y ESTAR EN CONDICION DE PRESENTAR LAS ACLARACIONES Y/O SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.




NOTA Nº 744

26 DE JULIO DE 2021

CON ESTA FECHA SE CONSTATA LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO:


• 3 ELECTRICOS EN AREA DE SUBESTACION.



NOTA Nº 745

26 DE JULIO DE 2021

EL DIA DE HOY SE ENVIA VIA CORREO ELECTRONICO INFORME DE LOS DETALLES A CORREGIR, DADO QUE SE FUERON PRESENTANDO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES O POR VIGIOS OCULTOS QUE SURTIERON POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS. DICHO CORREO SE ENVIO AL ING. MANUEL TREVIZO - CON COPIA PARA LA ING. KARINA MUÑOZ, ARQ. MARIELA ALVAREZ Y EL ING. LORENTO RUACHO DE PROURVIA.



NOTA Nº 746

28 DE JULIO DE 2021

EL DIA DE HOY SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO LOS PLANOS AS BUILT CORRESPONDIENTES A LAS DISCIPLINAS CIVIL, ESTRUCTURA, HIDROSANITARIA, SE REVISARON Y NO PRESENTAN

→

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 292

MODIFICACIONES, POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA CONTRA-
TISTA MODIFICAR LOS PLANOS DE ACUERDO A LOS CROQUIS
PROPORCIONADOS EN SU MOMENTO, DE LOS CUALES SE CUEN-
TAN CON LOS ACUSES CORRESPONDIENTES Y ESTAN DISPONI-
BLES PARA SU CONSULTA.

NOTA Nº 747

28 DE JULIO DE 2021

EN RELACION A LA NOTA Nº 734 SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE CONEXIONES EL DIA DE HOY, PARA PODER SOLICITAR LA VISITA DE INSPECCION DE CFE, SIN CUYA APROBACION NO ES POSIBLE LA ENTREGA DE LA CARTA ENTREGA-RECEPCION, SIN ESTA ACTA NO ES POSIBLE INICIAR CON LOS TRABAJOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO.

NOTA Nº 748

30 DE JULIO DE 2021

EL DIA DE HOY TUVO LUGAR LA VISITA DE INSPECCION POR PARTE DE CFE, PARA REVISAR LA INSTALACION CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION DE TABLEROS TDB2, TDBN2 Y TDBN3, DESDE TRANSFORMADORES, A LAS BASES DE MEDIDOR, SOLICITANDO LA REUBICACION DE ESTOS ULTIMOS PARA CUMPLIR CON LA ALTURA MINIMA DE 1.60M A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, EN DICHA REUBICACION SERÁ NECESARIO INSTALAR UN SOPORTE QUE RECIBA LA BASE DEL MEDIDOR, DADO QUE NO HAY ESPACIO EN EL MURETE DE MEDICION, EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS INTERRUPTORES Y GABINETES. DEL MISMO MODO CFE SOLICITA LA INSTALACION DE UN DISPOSITIVO QUE PERMITA COLOCAR SELLOS EN LOS DUCTOS EN SALIDA DE TRANSFORMADORES HACIA INTERRUPTORES.

BITÁCORA DE OBRA


FECHA / /


N° 293

NOTA N° 749

2 DE AGOSTO DE 2021

EL DIA DE HOY SE CONSTATA QUE NO EXISTE FUERZA DE TRABAJO EN AREA DE SUBESTACION, EN GENERAL NO SE CUENTA CON FUERZA DE TRABAJO EN NINGUN FRENTE.







NOTA N° 750

3 DE AGOSTO DE 2021

EL DIA DE HOY SE CONSTATA QUE NO EXISTE FUERZA DE TRABAJO EN OBRA.








NOTA N° 751

4 DE AGOSTO DE 2021

A LA FECHA NO SE HAN INSTALADO LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE 100 KW, 220/127 VOLTS 3F-4H, FP80 MODELO S-100 C MCA SELMEC. CABE SEÑALAR QUE EL OFICIO DE INSPECCION DE LAS INSTALACIONES, POR PARTE DE LA UNIDAD DE INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, NO SE ENTREGARA EN TANTO NO SE ECUENCUN (TREN) TOTALMENTE DETERMINADAS LAS INSTALACIONES







NOTA N° 752

4 DE AGOSTO DE 2021

A LA FECHA NO SE HAN INSTALADO LAS ZAPATAS CON 4 ORIFICIOS DE 1200 AMP. EN INTERRUPTORES PRINCIPALES Y CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTOS.







BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 294

NOTA Nº 793

4 AGOSTO 2021

SE RECIBEN EL DIA DE HOY LAS ESTIMACIONES Nº 59 y 61 CORREGIDAS, QUE INCLUYEN EL RESUMEN PARA SU REVISION, ESTO EN RELACION A LA NOTA Nº 605. EN LA QUE SE CITA QUE NO SE ENTREGABAN LAS ESTIMACIONES CORREGIDAS Y CON EL RESUMEN PARA SU REVISION. LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE REVISION DE ESTIMACIONES Y ESCALATORIAS SE ENCUENTRA EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE REVISION CORRESPONDIENTE.

NOTA Nº 794

5 AGOSTO 2021

CON ESTA FECHA SE LLEVO A CABO REUNION EN LAS INSTALACIONES DE PRODECH, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA LISTA DE DETALLES ENVIADA VIA CORREO ELECTRONICO A LA CONTRATISTA Y PRODECH, EN LA CUAL SE LLEVARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS.

- SE AGENDA REUNION PARA EL DIA 6 DE AGOSTO PARA REVISAR LOS AVANCES EN LOS PLANOS ASBUILT.
- SE REUBICAN BASES DE MEDICION DE ACUERDO A SOLICITACIONES DE C.F.E.
- SE AGENDA REUNION EN OBRA PARA OBSERVAR EN SITIO LOS DETALLES SEÑALADOS EN LA LISTA, PARA EL DIA 9 DE AGOSTO 2021

NOTA Nº 795

6 AGOSTO 2021

EL DIA DE HOY SE LLEVO A CABO REUNION EN LAS INSTALACIONES DE PRODECH PARA REVISAR LOS PLANOS ASBUILT CON LOS QUE SE CUENTA, SE OBSERVA QUE SOLO SE INCLUYO LA LEYENDA PLANO ASBUILT, SIN EFECTUAR MODIFICACIONES A LOS PLANOS, POR LO QUE SE ACORDO EFECTUAR UN RECORRIDO EN CAMPO PARA INDICAR LOS CAMBIOS A REALIZAR.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº 295

NOTA Nº 756

6 AGOSTO 2021

LA UNIDAD DE INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS - INFORMA QUE ESTARA FUERA DE LA CIUDAD DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 19 AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021. EL ULTIMO DIA PARA REVISAR LAS INSTALACIONES Y EMITIR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SERA EL DIA 18 DE AGOSTO POR LA MAÑANA.

NOTA Nº 757

9 AGOSTO 2021

EL DIA DE HOY SE EFECTUO VISITA DE OBRA POR PARTE DE PRODECH, EL ING. FABIAN SANTANA M, EL ING. MANUEL TREVIZO, EL ING. JESUS JOSE ESTRADA, LA ING. KARINA MUÑOZ Y LA ARQ. MARIELA ALVAREZ, POR PARTE DE PROURNIKA EL ING. LORENZO RUACHO Y EL ING. DAVID ALDEBETE, Y SUPERVISION, ING. MARIO CHAVEZ B, ING. BRENDA DIAZ Y ARQ. JORGE MORALES, PARA ACORDAR LA SOLUCION DE LOS DETALLES SEÑALADOS EN LA LISTA ENVIADA POR CORREO. ACUERDOS:

- SELLAR TUBO SUCCION CISTERNA
- APLICAR OBTURADOR EN LA ZONA DE LA BANDA OJILLADA.
- GENERAR PRECIO PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL PARA CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EJE 1-I
- FUERA DE LA CIUDAD U.I.E. ENTRE 19 AGOSTO - 2 SEPTIEMBRE
- COLOCAR ORANA AL DREN DE LOS REGISTROS.
- CERRAR RAMPA NIVELADORA PARA OBSERVAR EL DENIVEL, ENVIAR FOTOGRAFIA AL ING. FABIAN SANTANA, PARA TOMAR DECISION.
- RECORTAR SARDINEL DE ALUMINIO EN PUERTA CUARTO DE COMPRESORES
- SELLAR FILTRACIONES DE AGUA EN PLAFON METALICO EXTERIOR Y REPARAR
- REPARAR FILTRACIONES DE AGUA EN CANALON INTERIOR
- REVISAR PARA CAMBIAR CERAMICA (1 pza) EN ACCESO A COMEDOR
- AJUSTAR PUERTA DE ACCESO A ESCALERAS NIVEL 10.00
- BOTERAS NIVEL 14.42 POR LA JUNTA CONSTRUCTIVA, REPARAR.
- HUMEDAD EN TOMACORRIENTES DE LA TERRAZA.
- CORREGIR SELLO EN VIDEO EJE 6 Y ESCALERA DE EMERGENCIA 14.42
- INSTALACION POR PARTE DE PRODECH DE SARDINEL PUERTA HACIA - TERRAZA
- SACAR CON PENDIENTE EL AGUA DE JARDINERA Y CON UNA COLADE RA CON FILTRO DESCARGAR. COLOCAR BOQUILLA EPOXICA DONDE ESTA LA FILTRACION HACIA NIVEL 2
- LIJAR Y PINTAR MACETEROS DE TERRAZA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N° 296


- ARMAR HAMACAS PARA VERIFICAR QUE NO FALTE NADA SIN INSTALAR.
- SELLOS EN CANCELES CORREGIR (DE LABORATORIO Y COMEDOR)
- LOS SELLOS EN UNIONES DE CANALONES NO SE EJECUTARAN EN ESTE CIERRE.



NOTA N° 758

10 AGOSTO 2021


EL DIA DE HOY SE PRESENTA PERSONAL DE ARVE CONSTRUCTORA PARA CORREGIR EL SARDINEI DE ALUMINIO DEL CUARTO DE COMPRESORES, QUEDANDO PENDIENTE EL PERFILADO Y PINTURA DEL VANO.



NOTA N° 759

12 AGOSTO 2021

HASTA EL DIA DE HOY SE RETOMAN LAS ACTIVIDADES REFERENTES A LA INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE SUBESTACION.

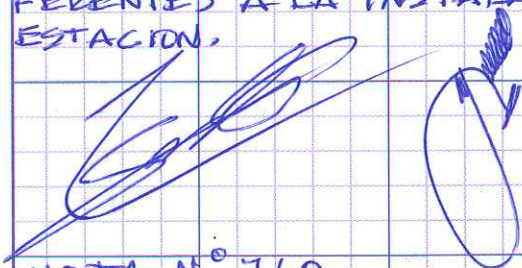

NOTA N° 760

13 AGOSTO 2021

EL DIA DE HOY SE PRESENTO PERSONAL PARA EL SELLO DE VENTANAS EN EJE 6 DE LABORATORIOS, COMEDOR Y OFICINA, DEJANDO PENDIENTES DE SELLO EN OFICINAS Y PASILLO DE LABORATORIO EJES 6-D.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 297

NOTA N° 761

16 AGOSTO 2021

EL DIA DE HOY POR LA TARDE LLEBAN A OBRA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA; PARA PROCEDER A SU INSTALACION, EL MOTOR DIESEL MARCA DAUDOUIN, ALTERNADOR MARCA LEROY-SOMER Y REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE MARCA LEROY-SOMER.



NOTA N° 762

17 AGOSTO 2021


EL DIA DE HOY SE LLEVO A CABO REUNION EN LAS INSTALACIONES DE PRODECH PARA TRATAR LOS PUNTOS SIGUIENTES:

- 1) PLANOS ASBUILT - ALCANCES Y A QUIEN CORRESPONDE LA EJECUCION.
- 2) ENTREGA DE TRABAJOS PARA REVISION POR UIIE.
- 3) ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

• LA ELABORACION DE LOS PLANOS SERA POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y REVISION POR SUPERVISION, PARA LO CUAL SE REVISARAN EN CONJUNTO LOS PLANOS Y DETALLES PARA LA MODIFICACION DE ESTOS.

• INFORMA PROURNIKA QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUIRAN TENTATIVAMENTE EL DIA 21 DE AGOSTO 2021 EN EL AREA DE SUBESTACION.

• PROPONE EL ING. CARLOS RUACHO LLEVAR A CABO EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DEJANDO POR ESCRITO UNA CLAUSULA QUE INDIQUE QUE LA PRUEBA DE EQUIPOS Y EL ELEVADOR SERA POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº 298

Nota no 703

Con referencia a la nota de bitácora no 576, y en función a las condiciones climáticas que se han venido presentando a lo largo del mes de julio y agosto se realizó una exhaustiva revisión a los sellos del eje G correspondiente al muro colindante con terraza, se retiraron los sellos y no se encontró humedad debajo de los mismos de igual manera se reforzaron, sin embargo en el área de la jardinería que se encuentra en el perímetro del sistema de la terraza se encontró que el sistema de impermeabilización ya estaba desmoronado en algunas áreas que existe humedad debajo del producto y en el muro que corre paralelo al eje G, teniendo 3 días sin llover aún existe humedad en la zona lo cual indica que por esa área se está filtrando el agua a el área antes mencionada, es necesario que inmediatamente se atiendan las actividades a realizar en la zona de la jardinería ya que no se suena de nada que la contratista realice la reparación si no se le da el uso adecuado a esa zona.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota No 704

30/08/2021

SE SOLICITA AL CONTRATISTA, PREVIO LA AUTORIZACIÓN DEL P.V. CORRESPONDIENTE, UN TOMACORRIENTE ADICIONAL PARA EL PRECALENTADOR DE LA BOMBA DIESEL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO.

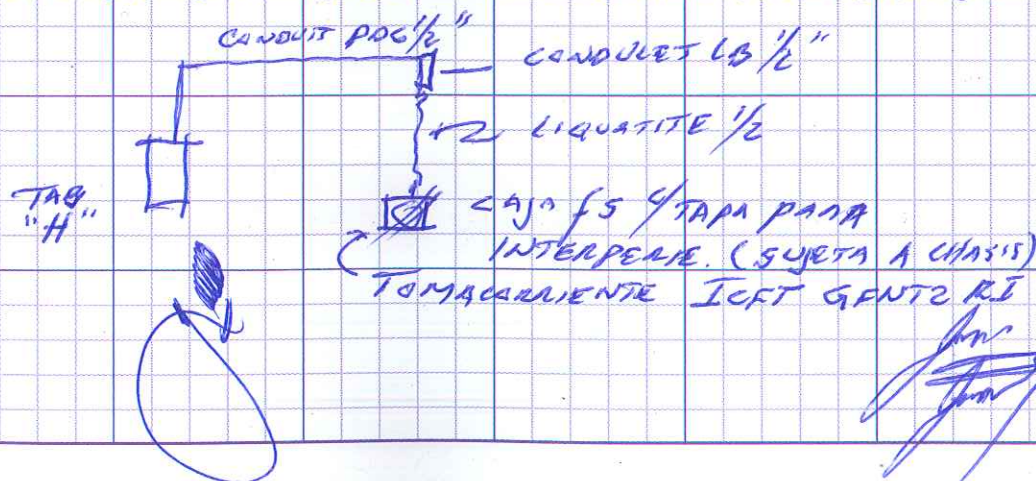

[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N° 299

NOTA N° 765

30 AGOSTO 2021

EN SEGUIMIENTO A LAS NOTAS N° 749 y 759, EL DIA DE HOY NO SE HA PRESENTADO PERSONAL A LABORAR EN EL AREA DE SUBESTACION, QUEDANDO PENDIENTE: LA INSTALACION DE CABINAS EN PLANTAS DE EMERGENCIA, INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX EN CUARTO DE BOMBAS, MODIFICACION DE PLANOS ELECTRICOS PARA ENTRELA A UIIE CONEXION DE UNIDAD CONDENSADORA UC-09-A. SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA HABER ENTRELA DE MANERA FORMAL DE LOS TRABAJOS, PARA ESTAR EN CONDICION DE PROGRAMAR LA VISITA DE INSPECCION DE LA INSTALACION ELECTRICA.



NOTA N° 766

30 AGOSTO 2021

EN RELACION A LA NOTA N° 757 SE HAN CORREGIDO ALGUNOS DE LOS SEÑALAMIENTOS CONTENIDOS EN LA NOTA, QUEDANDO PENDIENTES LOS SIGUIENTES:

- 1) EN LA PIEZA DE CERAMICA FLOJA, SOLO SE APLICÓ BOQUILLA, DEJANDO LA PIEZA COMO ESTABA.
- 2) FALTA CORREGIR RAMPA NIVELADORA, EN VIRTUD DE QUE NO FUE ACEPTADA POR ESTAR REPARADO EL MECANISMO Y POR CONSECUENCIA PIERDE SU GARANTIA, ADENAS DE QUE NO ASIENTA CORRECTAMENTE EN EL PISO
- 3) FALTA TERMINAR Y ENTREBAR LAS CORRECCIONES EFECTUADAS RELATIVAS AL SELLO DE FILTRACIONES DE AGUA EN PLAFON METALICO.
- 4) FALTA CORREGIR EL CIERRE DE PUERTAS DE ACCESO A ESCALERAS NIVEL 10.
- 5) SACAR CON PENDIENTE AGUA DE JARDINERA.
- 6) FALTA SUMINISTRAR 2 BANCHOS Y 1 PIEZA DE HULE DE HAMACAS.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N° 300

NOTA N° 767

30 AGOSTO 2021

SE LLEVO A CABO PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA DE GAS LP, ENCONTRANDOSE UNA PERDIDA DE PRESION DEBIDO A UN CODO POROSO, EL CUAL FUE SUSTITUIDO, LLEVANDOSE A CABO DE NUEVO LA PRUEBA CORRESPONDIENTE SIENDO ESTA SATISFACTORIA. SE SOLICITA A LA CONTRATISTA HAGA ENTREGA DEL PLANO ASBUJADO PARA SER VERIFICADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.



[Handwritten signature]

NOTA N° 768

30 AGOSTO 2021

SE SOLICITA A LA CONTRATISTA HAGA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRECIOS EXTRAORDINARIOS:

- 1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARLO PARA TRINCHERA A BASE DE ANULO DE 1 1/2, CON LONGITUD TOTAL DE 48 ML.
- 2) INSERTO OPERACION CON CABLE DE 200 AMP, 25 KV, PARA CONEXION DE CODO A TERMINALES DEL SECCIONADOR.
- 3) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TIPO CONO DE ALUMINIO 25 KVA, EXTERIOR, CON TERMINAL PONCHABLE Y CONEXION A TIERRA.
- 4) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CON 100% DE AISLAMIENTO TIPO XLP PARA 25 KV CAL 1/0
- 5) SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO METALICO NEMA 3B DE .93 X .80 X .30 M PARA CANALIZAR LA ALIMENTACION PRIMARIA DE CADA TRANSFORMADOR, QUE COMPRENDA DESDE SALIDA DEL TUBO HASTA LA BARRANTA DEL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR.
- 6) ALIMENTACION A COMPRESORES DESDE EL DESCONECTADOR EXISTENTE HASTA LA CAJA DE CONTROL DE CADA COMPRESOR
- 7) DESCONECTAR ALIMENTACION DE BOMBA CONTRA INCENDIO
- 8) REUBICAR BASES DE MEDICION EN MURO CONCENTRADOR DE ACUERDO A PROYECTO AUTORIZADO POR CFE, QUE INCLUYA 13 TERMINALES.
- 9) PROYECTO Y TRAMITE DE ACUERDO A INDICACIONES DE CFE, ANTE EL DEPARTAMENTO DE TRAMITES CFE.
- 10) SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACK 3, 3 POLOS, 100 AMP, 600V 18 KA MCA SQUARE D OF 1, OF 2, C-2, C-1
- 11) SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR




BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº 301

TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE 3X70A SQUARED PARA SUSTITUIR LOS DE PROYECTO.
LA SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICA SU AUTORIZACION, ESTA SERA A CARGO DE PRODECH Y REVISION POR SUPERVISION.




[Handwritten signature]

NOTA Nº 769

31 AOSTO 2021

POR SOLICITUD DEL ING. JESUS ESTRADA DE PRODECH SE DEBERA CONSERVAR EL POSTE QUE ESTA ACTUALMENTE SOPORTANDO EL TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION PROVISIONAL, EN VIRTUD DE QUE NO SE INSTALO EL POSTE CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO 46 3.2, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION TRIPASICA CLAVE TS 600 CDE, AREA-SUBTERRANEA DE 25 KVA EN POSTE 12:750.



[Handwritten signature]

NOTA Nº 770

31 DE AOSTO DE 2021

EN REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA C.O.P.-009-2020-P, AL CONVENIO DE REPROGRAMACION C.REP.-084-2021-P AL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P, CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-042-2021-P, CONVENIO DE REPROGRAMACION C.REP.-115-2020-P, CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-036-2020-P, CONVENIO DE REPROGRAMACION C.REP.-085-2021-P, CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº C.O.P.-S.O.P.-62-2021-P, SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE SUPERVISION, EN EL EDIFICIO DENOMINADO SPARK, UBICADO EN AV. METALMECANICA Nº 8901, HABIENDO EFECTUADO UN RECORRIDO FINAL POR LAS INSTALACIONES CON PERSONAL DE PRODECH, SE NOTIFICO DE LAS CORRECCIONES PENDIENTES DE EJECUTAR POR LA CONTRATISTA Y DE PENDIENTES GENERALES DE ATENDER, SIENDO LOS SIGUIENTES.

- 1) INSTALACION DE CABINAS DE EMERGENCIA DE LAS PLANTAS.
- 2) COLADO BANQUETA EN POSTE DE SUBESTACION PROVI-



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 302

SIGNAL

- 3) ENTREGA TOTAL DE PLANOS AS-BUILT (SE EFECTUARON - VARIAS REVISIONES QUEDANDO PENDIENTES DE REVISION)
- 4) REPARACION PINTURA MOBILIARIO TERRAZA
- 5) REEMPLAZO DE ZOCLO DAÑADO POR FILTRACIONES DE AGUA EN PASILLO DE LABORATORIO Y AREA DE COMEDOR.
- 6) CORRECCION DE SELLOS EN EMPAQUES Y EN CANCELES NIVEL 19.72 M EJES YI E Y6
- 7) ENTREGA DE PARTES FALTANTES DE HAMACAS.
- 8) SELLO EN B.A.P. NIVEL 19.72 (CONTINUAN FILTRACIONES)
- 9) REPARACION RAMPA NIVELADORA
- 10) SISTEMA CONTRA INCENDIO (PUESTA EN OPERACION)
- 12) PUESTA EN MARCHA ELEVADOR
- 13) PENDIENTE EMISION DE ACTA DE INSPECCION DE LA UVIE, EN VIRTUD DE QUE LOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO Y ES NECESARIO SU TERMINACION PARA PROCEDER A LA INSPECCION FINAL Y LA EMISION DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. EN TANTO NO SUCEDA LO ANTERIOR NO SE PUEDE EMITIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ENCARGADO DE LA VERIFICACION.
- 14) RESUMEN FINANCIERO FINAL, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA SU REALIZACION.
- 15) LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A BANQUETAS FISURADAS, PINTURA EN EXTERIOR (AMPOLLADA), APLANADOS EXTERIORES EN LABORATORIO, PISOS EN LABORATORIO, RENIVELADO DE JARDINERAS EN ESTANQUE, CERAMICAS EN TERRAZA, ANDEN DE CARLA, RAMPA NIVELADORA FUERON ACEPTADAS POR EL ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ
