

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota No 47

26/ABRIL/2021


CON REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR SE LE HACE MENCION A LA CONTRATISTA QUE LA PERSONA QUE COMPRO EL TANQUE VA A LLEVAR GENTE PARA CORTARLO EN PARTES Y PODERLO SACAR PARA DEJAR LIBRE EL AREA QUE OCUPA ESTE.




Nota No 48

03-MAYO-21

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE ESTE DIA SE CONCLUYO EL ARMADO DE TANQUE CORRESPONDIENTE A COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO EN Q. JUANES CHIH.

Nota No 49

13/MAYO/2021

SE HACE MENCION A LA CONTRATISTA POR PLATICA CON J. CARLOS ESTRADA DE ATENCION A USUARIOS Y SE NOTIFICARA POR MEDIO DE OFICIO QUE NO SE PODRA USAR A CABO EL DEMONTAJE DE TANQUE EXISTENTE HASTA QUE NO SE TENGA ASEGURADO EL SUMINISTRO A LOS USUARIOS.




Nota No 50

14-JULIO-21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONCLUYE EN TALLER LA FABRICACION DE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.




Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 51 26-JULIO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TRANSPORTA LA COLUMNA
AL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA PARA PROCEDER HOY
MISMO A INSTALAR EN EL TANQUE.




NOTA N° 52 01-AGOSTO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONCLUYE EN TALLER
LA FABRICACION DE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL
TANQUE DEL COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO EN
CD. JUAREZ CHIH.



NOTA N° 53 03-AGOSTO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE TRANSPORTA LA COLUMNA
CORRESPONDIENTE AL TANQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, PARA
INICIAR SU INSTALACION.



NOTA N° 54 14-AGOSTO-21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONCLUYE LA INSTALACION
DE LA COLUMNA, CANTAPONES Y SOPORTES, CORRESPONDIENTES
AL TANQUE DEL COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CD.
JUAREZ CHIH.



Elaborado por:

Recibido por:


Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 55

16 AGOSTO - 2021

CON ESTA FECHA SE LE HACE MENCIÓN A LA CONTRATILTA QUE EL TANQUE DE PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO SOLO SE COLOCARON 12 CISTERNAS DE (20-30 x 0.32)

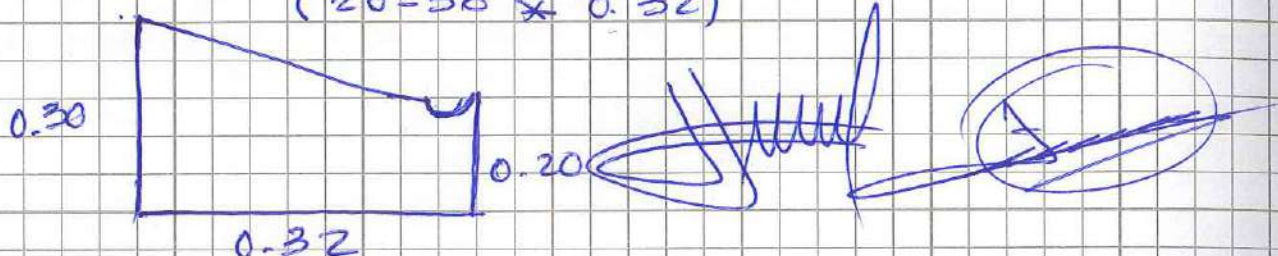

NOTA N° 56

17- AGOSTO- 21

SE INFORMA QUE HOY SE INICIA LA LIMPIEZA DEL TANQUE Y COLUMNA CON SAND-BLAST EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CO. JUAREZ CHH.



NOTA N° 57

20- AGOSTO- 21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CONCLUYE LA LIMPIEZA CON SAND-BLAST EN EL TANQUE Y COLUMNA CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CO. JUAREZ CHH.



NOTA N° 58

27- AGOSTO- 21

SE INFORMA QUE HOY SE CONCLUYE DE PINTAR EL TANQUE Y COLUMNA EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CO. JUAREZ CHH.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota No 59 27 AGOSTO / 2021
 CON ESTA FECHA SE LE HACE LA OBSERVACION A LA CONTRATISTA QUE EL DIA 25 DEL PRESENTE SE DETECTARON APOLLADURAS EN EL TANQUE POR LO CUAL SE NOS INDIQUE CUAL VA A SER LA SOLUCION A EL MISMO.

NOTA N° 60 27- AGOSTO - 21
 SE INFORMA QUE ESTE DIA SE ENVIO PERSONA A PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO CON EL FIN DE VALORAR LOS DAÑOS QUE PRESENTA EL TANQUE MENCIONADOS EN LA NOTA N° 59 DE ESTA BITACORA Y DAR SOLUCION INMEDIATA AL DAÑO.

NOTA N° 61 30- AGOSTO - 21
 SE INFORMA QUE PARECIA REUNION CON EL FABRICANTE DE LOS TANQUES SE ACONDO, RETIRAN LOS GATOS DAÑADOS Y FABRICAN EN TALLER DICHOS GATOS.

NOTA N° 62 01- SEPTIEMBRE - 21
 SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INICIA CON EL RETIRO DE LOS GATOS DAÑADOS Y SU REPOSICION, PARA PROCEDER A RETOCAR LOS GATOS INVOLUCRADOS Y ESTAR EN CONDICIONES DE PROGRAMAR LA GRUA PARA SU MONTAJE.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA No 63

02/SEPTIEMBRE -21


ESTA SUPERVISION HACE MENCIÓN DE NO ESTAR DE ACUERDO CON CANTIDAD DE KILOS COBRADOS EN EL CONCEPTO 3.1.1 DESMONTAJE DE TANQUE, DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO YA QUE LA CANTIDAD ESTA CALCULADA EN BASE A LA FABRICACION DE UN TANQUE NUEVO YA QUE EL TANQUE EXISTENTE (VIEJO) Y CONUNA SUFRIERON DEGRADACION POR LO CUAL SE ESTAN REALIZANDO DICHOS TRABAJOS, CUANDO LO CORRECTO SERIA QUE ESTOS AL MOMENTO DE QUITARSE SE PESARAN PARA DETERMINAR SU PESO, ASI COMO EN LOS CONCEPTOS 1.1.1, 2.1.1 QUE CORRESPONDEN A TANQUES EN COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y PARQUE INDUSTRIAL QUAHTEMOC, O SI HAY ALGUNA OTRA MANERA DE DETERMINAR EL PESO DE ESTOS.

NOTA No 64.

02/SEPTIEMBRE/21

CON REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR ESTO SE VIO Y SE CONVENTO EN SU MOMENTO CON EL INQ. MANUEL TREVIÑO Y LA CONTRATISTA Y NO SE LLEGO A NINGUN ACUERDO PARA LA MEDIACION DE LO ANTERIORMENTE EXPUERTO Y TOMARON LA DECISION DE ESTIMAR EN BASE A FABRICACION DE TANQUES NUEVOS.

NOTA No 65

04/SEPTIEMBRE/2021

DE LAS NOTAS NUMERO SESENTAY TRES Y SESENTAY CUATRO. SE LLEVO Y CONTRATO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CON MANO DE OBRERO, 2.1.1, 3.1.1 LA CANTIFICACION CON LAS TABLAS DE LA ADIAC. EL CONCEPTO NO DICE QUE SE PESARA DESPUES DE QUE SE REALICEN LAS MANIOBRAS DICE QUE SE DEBE EN EL PRIMER KILOMETRO O DENTRO DE EN EL PESO A CADA KILOMETRO.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 66 06 SEPTIEMBRE - 21

REFERENTE A LAS NOTAS N.º 63 Y 64 DE ESTA BITÁCORA DE OBRA, SE LE RECUERDA A LA SUPERVISIÓN, QUE EL CONCEPTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (PUOT), SE CALCULO EL PISO CON DIMENSIONES REALES, FORMULAS PARA FIGURAS GEOMETRICAS ESTABLECIDAS Y CATALOGO DE PESOS Y MEDIDAS ADIAC, PROPORCIONADAS POR PRODECH, POR MEDIO DE SU DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, SIGUIENDO LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS, ESTABLECIDAS POR PRODECH, EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRODECH / LICIT - PIC - PIA / 02 / 2020, Y SIENDO ESTA UNA REPOSICION DE LOS TANQUES EXISTENTES, SIN REFORZO DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION, SE PROCEDE A GENERAR CON LOS DATOS EXISTENTES PARA POSTERIORMENTE PRESENTAR LOS GENERADONES, LOS CUALES PUENON REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION DE PRODECH PARA SU COBRO.

AL HABER COMERCIALIZADO LOS ELEMENTOS DESMONTADOS, SIN TOMAR EN CUENTA A ESTA CONTRATISTA, DESCONSIDERANDO LAS PARTES QUE SUPUESTAMENTE SE PESARON, ASI COMO TAMPOCO SE CONSIDERANON LOS ELEMENTOS QUE POSTERIORMENTE SE DESMONTARON (TUBOS DE 10", 6" Y 3") PIEZAS ESPECIALES), POR LO ANTERIORMENTE EXPUUESTO, NOS ES IMPOSIBLE ACEPTAR UNA TASA PARCIAL O UN DICHO, COMO MEDIDA DE PAGO DE LOS CONCEPTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA.

CABE MENCIONAR QUE ESTA CONTRATISTA SE APOYO EN EL LABORATORIO DE SOLDADURA, ASI COMO EN LOS METODOS DE CALCULO CIENTIFICOS EXISTENTES, PARA COMPROBAR EL PESO COBRADO.

SE ANEXA A LA PRESENTE LOS GENERADONES AUTORIZADOS, A LOS QUE SE HACE MENSIION EN ESTA NOTA.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /


Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 67

8-SEPTIEMBRE-21

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE, DESDE DICIEMBRE DEL 2020 A MAYO DEL 2021, NUESTRO AVANCE REAL SE VIÓ AFECTADO CONSIDERABLEMENTE, DEDIDO A LOS BIOTES DE COVID QUE SE REGISTRARON EN EL TALLER DE FABRICACION, CABE MENCIONAR QUE DICHO TALLER SE CERRO TEMPORALMENTE DEDIDO A QUE GRAN PARTE DE SOLDADORES, OBREROS Y AYUDANTES, SE CONTAGIARON. POR LO QUE SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE, SE SUSPENDIERON LABORES EN 3 OCAIONES Y AL REINICIAR LABORES, PARTE DE LOS TRABAJADORES YA NO REGRESO POR TEMOR A CONTAGIO, YA QUE SE LAURENTARON 2 DECELOS.

Por otra parte, se comenta que otro factor que afectó el avance, fue la falta de liquidez, generando por la falta de pagos y la descapitalización por haber comprado todos los materiales, con la finalidad de prevenir incrementos (previo aviso de nuestros proveedores quienes nos alertaron de incrementos altos). Por mas dicha descapitalización se debio a la falta de flujo, por la detención de los cheques correspondientes a cada estimación, a partir de la estimación N° 10.





NOTA No 68

10/SEPTIEMBRE/21

LOS KILOS QUE SE SE SEÑALAN O SE HACEN MENCION EN LAS NOTAS 63 Y 64 SE RESPALDA CON FACTURAS EMITIDAS POR LA CONTRATANTE (PRODECH) AL COMPRADOR DEL TANQUE SE QUITO LA CUAL SE ANEXIA LA CONTINUACION.













Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

Nota No 69

10/SEPTIEMBRE/21

LOS KILOS QUE SE SEÑALAN O A LOS QUE SE HACE MENCIÓN EN LAS NOTAS 63 Y 64 DE ESTA BITÁCORA SE RESPALDAN CON FACTURA EMITIDA POR LA CONTRATANTE (PROPECH) AL COMPRADOR DEL TANQUE QUE SE QUITO DE LA CUAL SE ANEXA COPIA A CONTINUACION.




Nota No 70

13/SEPTIEMBRE/21

CON REFERENCIA A LA NOTA 67 SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS COMENTARIOS O JUSTIFICACIONES SOBRE EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBIDO A LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL (COVID) SON VALIDAS PERO EN CUANTO A LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES SE LE RECUERDA QUE SE TOMO LA DECISION DE DETENER EL PAGO DE ESTAS (ESTIMACION 10 EN DELANTE) FUE DEBIDO A LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEBIDO AL PAGO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P EN TRES ESTIMACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LO CUAL SE TOMO LA DECISION DE LA DETENCION DEL PAGO DE ESTAS, DE LO CONTRARIO SE HABIAN ACREDITADOS A SANCIONES TANTO ECONOMICAS COMO LEGALES QUE EN SU MOMENTO LO AMERITAN.




Nota No 71

13/SEPTIEMBRE/21

SE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE LLEVO A CABO EL MONTAJE E INSTALACION DEL TANQUE RECIBIDO EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN LA CA. DE JIMENEZ CHIL, PARA LA REMEDIACION DE LOS DETALLIS DETECTADOS POR LA SUPERVISION. CABE MENCIONAR QUE LOS TANQUES CORRESPONDIENTES A LOS PARQUES DE CUAUHTEMOC Y CALIHUATLA, SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y PINTADOS, SOLO ESPERANDO DISPONIBILIDAD DE SPAVA PARA SU MONTAJE.




Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 72

17/SEPTIEMBRE/21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE INSTALO LA GUA EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH. PARA LLEVAR A CABO EL MONTAJE DEL TANQUE CORRESPONDIENTE AL LUGAR, EL CUAL NO SE PUDO REALIZAR DEBIDO A LAS RAJAS DE VIENTO QUE SE PRESENTARON, POR LO QUE NO SE DECIDIO COMENZAR EL RIESGO PARA ASI EVITAR ALGUN DENCANCE, QUEDANDO PROGRAMADO EL MONTAJE PARA EL DIA DE MAÑANA A LAS 5:00 A.M.





NOTA N° 73

18/SEPTIEMBRE/21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE MONTÓ EL TANQUE CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CON EXITO SE PROCEDE A INSTALAR LAS TUBERIAS CORRESPONDIENTES PARA PODER CARGAR EL TANQUE Y EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS.






NOTA N° 74

20/SEPTIEMBRE/21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE CARGO A SU CAPACIDAD EL TANQUE DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN LA CO. DE JUAREZ CHIH. Y SE PISO EN FUNCIÓN CON EXITO.





Elaborado por:


Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha / /

Folio N° /Anexo N°



NOTA N° 75 23/SEPTIEMBRE/21
SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EN EL TANQUE DEL COMPLEJO INDUSTRIAL AEROPUERTO SE DETECTÓ UN DETALLE DE PINTURA EN EL EXTERIOR. POR LO QUE SE SOLICITA SE REPADE A LA VELOCIDAD.

NOTA N° 76 24/SEPTIEMBRE/21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE POSO EN FUNCIONAMIENTO EL TANQUE CORRESPONDIENTE A/ COMPLEJO INDUSTRIAL CHIRAHUA CON ÉXITO Y SIN DETALLE ALGUNO

NOTA N° 77 27/SEPTIEMBRE/21
SE INFORMA QUE ESTE DIA SE HUBO INSTALADA LA GUÍA PARA REALIZAR EL MONTAJE DEL TANQUE CORRESPONDIENTE A/ TANQUE INDUSTRIAL COAHUILTECO. DICHO MONTAJE NO FUE POSIBLE DEBIDO A LAS FUERTES RAYAS QUE SE PRESENTARON EN LA REGIÓN, POSPONIENDO LA MANIOBRA PARA EL DIA DE MAÑANA A LAS 6:00 AM.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA N.º 78

28/SEPTIEMBRE/21

SE INFORMA QUE ESTE DIA SE REALIZO CON EXITO LA MANIOBRA PARA MONTAR EL TANQUE EN EL TANQUE INDUSTRIAL CUATTEMOC, PARA PROCEDER A SU LLENADO Y EFECTUAR PRUEBAS CORRESPONDIENTES.

NOTA N.º 79

29/SEPTIEMBRE/21

CON REFERENCIA A LA NOTA 69 SE HACE MENCIÓN QUE EN PLATICA CON EL ING. MANUEL C. TREVIÑO CH. CONSENTO QUE EL DESMONTAJE DE LOS TANQUES EXISTENTES SE PAGO DE ACUERDO A TABLAS DE PESOS Y MEDIDAS VIGENTES EN EL MERCADO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPOÑIAN O ESTAN

NOTA N.º 80

29/SEPTIEMBRE/21

CON REFERENCIA A LA NOTA N.º 69 SE HACE MENCIÓN QUE EN PLATICA CON EL ING. MANUEL C. TREVIÑO CH. JEFE DEL AREA DE INGENIERIA DE PROYECTO CONSENTO QUE EL CONCEPTO DE DESMONTAJE DE LOS TANQUES EXISTENTES SE PAGARIA DE ACUERDO A TABLAS DE PESOS Y MEDIDAS VIGENTES EN EL MERCADO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS MISMOS Y A SU VEZ ESTE METODO DE PAGO ESTABA CONTEMPLADO EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA LICITACION O CONCURSO.

NOTA N.º 81

29/SEPTIEMBRE/21

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITÁCORA, POR LO QUE SE DAN POR CONCLUIDOS Y DECIDIDOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO AL QUE SE HIZO MENCIÓN EN LA APERTURA DE LA PRESENTE BITÁCORA, ESTA CONTRATISTA NO SE RESPONSABILIZA ALGUNA, SOBRE CUALQUIER DETALLE QUE SE PUERA PRESENTAR.

Elaborado por:

Recibido por:
