

Fecha:

No.

NOTA 17

FECHA 21-07-2022

SE SUSPENDEN TRABAJOS Y SE REACTIVAN 27-07-2022
POR MANTENIMIENTO DE PLANTA ASFALTERA Y NO SE
TENDRA MATERIA PRIMA PARA HACER LOS TRABAJOS
DE CARPETEO.

NOTA 18

FECHA 01/08/2022

SE EXTIENDE ASFALTO DE CARRIL CENTRAL Y CARRIL
DERECHO DE NORTE A SUR EN AV. INDUSTRIAS
DESDE LAS VIAS DE TREN HASTA LA AVENIDA
HOMERO

SE CONTINUA CON BACHEO EN EL OTRO SENTIDO
DE LA VIA. EN PARADAS CONTINUAN LOS LEVANTA-
MIENTO DE BACHES Y TOMA DE FOTOGRAFIAS
ANTES DE EXTENDER CARPETA SUPERIOR DE 2cm.

NOTA 19

FECHA 02/08/2022

SE EXTIENDE CARPETA DE CARRIL FALTANTE DE
NORTE A SUR EN AV INDUSTRIAS DE VIAS FERREAS
A LA AVENIDA HOMERO.

Y A SU VEZ SE INICIA CON EL TRAMO DE
SUR A NORTE DE LA AV HOMERO EN CARRIL DE
ALTA VELOCIDAD.

NOTA 20

FECHA 3-08-2022

SE ELABORA CARPETA 3cm ENTRE CANELONES
AL NO ESTAR FATIGADA NO REQUERIRA BACHEO,
SE INSTALARA UNA CARPETA DE 1cm PARA
NIVELAR GRIETAS Y SOBRE CARPETA DE 2cm.
DE ESPESOR.


Fecha:

No.:

NOTA 21

FECHA 4-08-2022

SE DA CIERRE DE TRAMO DE 2CM EN AV. DE LAS INDUSTRIAS, HASTA LA VIA DEL TREN Y SE ELABORA DETALLE DE CARPETA DE DIMENSION VARIABLE EN AREA DE VIA DE TREN Y A QUE NO SE TIENE LA FREZADORA, SE ELABORADA UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO PARA CIERRE DE AREA.

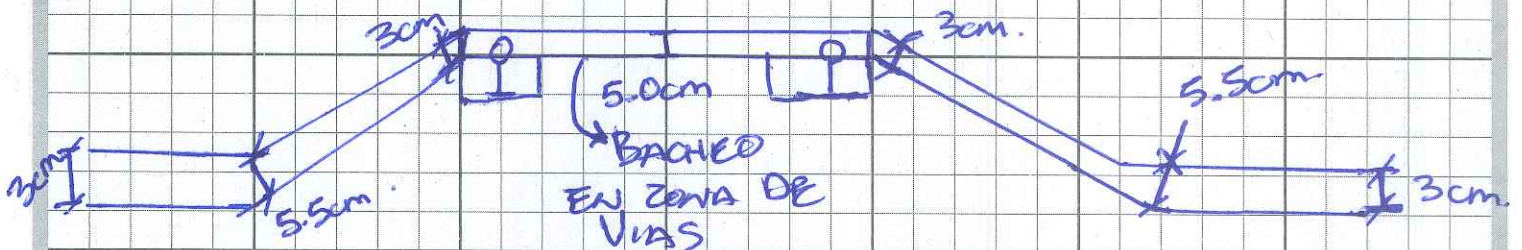

SE SOLICITA DAR LIMPIEZA EN TODA LA VIAJIDAD YA QUE QUEDARON RESTOS DE CARPETA EN CAMELLONES Y BANQUETAS.

NOTA 22

FECHA 05-08-2022

SE DA INICIO CON BACHES EN AV. VICTOR HUGO Y SE DA INICIO A TENDIDO DE CARPETA DE 2CM. SE INDICAN BACHES Y AGRIETAMIENTOS PRODUCTO DE LLUVIAS LOS CUALES SE SOLICITA CERRAR Y SE ELABORA LEVANTAMIENTO DE LOS MISMOS. SE RECIBE SOLICITUD DE EXTRAORDINARIO 01

NOTA 23.

FECHA 09-08-2022

SE DA REUNION DE BACHES EN AV. NICOLAS BOGOL, YA QUE SE EXTENDERA CARPETA. SE TOMAN FOTOGRAFIAS DE LOS BACHES. SE SOLICITA LIMPIEZA DE AV. INDUSTRIAS Y VICTOR HUGO. SE RECIBE SOLICITUD DE VOLUMENES EXEDENTES.

Fecha:

No.

Nota 24

Fecha 10-08-2022

SE DA INICIO A BACHEO Y TENDIDO DE CARPETA EN AV. RETORNO DE ANTONIO CASO EN ESTA AREA SE SOLICITO MEZCLA Y SE TRABAJA CON LA CUADRIULA DE MANTENIMIENTO.

Nota 25

Fecha 12-08-2022

SE INICIA BACHEO DE AV. PABLO NERUDA Y SE ELABORA TENDIDO DE CARPETA. EL DIA LUNES SE HARA MEDICION DE LAS CALLES RETORNO CASO, PABLO NERUDA Y BACHEO DE AV. RUDYARD KIPUNG. SE DARA EXTENDERORA Y SE DARA MANTENIMIENTO.

Nota 26.

Fecha 13-08-2022.

SE SOLICITA LIMPIEZA EN VIALIDADES YA CARPETEADAS AV. VICTOR HUGO, NICOLAS GOGOL, PABLO NERUDA, ANTONIO CASO Y KIPUNG. SE APRUEBA EXTRAORDINARIO EXT 1 EN OFICIO PRODECH/VI/075/2022.

Nota 27.

Fecha 15-08-2022

SE DA REVISION DE CALLES TERMINADAS EN CONJUNTO CON PERSONAL DE CONTRATISTA.

SE INDICAN PUNTOS DE LIMPIEZA.

SE RECIBE OFICIO CON SOLICITUD DE VOL. EXCEDENTES.

Fecha:

No.

NOTA 28
19-08-2022.

Por motivo de lluvia se suspendió tendido de carpeta, en Av. Rudyar Kipling se generó resquebrajamiento a causa de humedad, se solicita reparación, se aprueban vol. Excedentes Oficio PRODECH/UL/076BIS/2022

NOTA: SE INICIARÁ AV. MIGUEL DE CERVANTES TENDIDO DE CARPETA.

NOTA 29
19/08/2022

SE CONTINUAN TRABAJOS EN AV. MIGUEL DE CERVANTES, SE SOLICITAN SOLO 2 CAMIONES POR PROBABILIDAD DE LLUVIA.

NOTA: SE REVISARÁN TRAMOS LOS CUALES SE TENDIERON CON INICIO DE LLUVIA. EN CARRIL DE BATA HACIA AV TECNOLÓGICO.

NOTA 30
23-08-22

SE TIENDE CARPETA DE CARRIL CENTRAL, SE REUSA CON LABORATORIO CALIDAD DE MEZCLA Y TEMPERATURA, YA QUE SE PRESENTAN POROS LOS CUALES SE HARÁ REPARACIÓN.

Fecha:

No.

NOTA 31

FECHA 24-08-22

SE CONCLUYEN TRABAJOS DE BACHEO EN AV. MIGUEL DE CERVANTES Y SE DA INICIO A TENDIDO DE CARPETA EN SEGUNDO CUERPO.

NOTA 32

25-08-22

SE DA CONTINUIDAD A AV. MIGUEL CERVANTES SE PRESENTAN POROS JUNTO A CAMERONES YA QUE LA VEGETACION NO PERMITE HACER EL TRABAJO DE APLANADO, SE SOLICITA INSTALAR MEZCLA ASFALTICA O SELLO PARA ESTOS PUNTOS.

NOTA 33

27-08-22.

SE CONTINUA CON TENDIDO DE CARPETA EN AV. CERVANTES. EL DIA DE MAÑANA SE ATIENDEN DETALLES PRODUCIDO DE LLUVIA JUNTO CON POROS SE REVISAN TEMAS DE CALIDAD CON LABORATORIO LOS CUALES SE COMENTAN DENTRO DE PARAMETROS.

NOTA 34

FECHA 30-08-22

SE CIERRAN RECARPETEO O TENDIDO DE CARPETA EN AV. MIGUEL DE CERVANTES SE INDICAN NUEVOS DETALLES A REPARAR POR LLUVIAS, SE PD RECORRIDO EN PARQUE PARA INDICAR NUEVOS BACHES A REPARAR. SE RECIBE OFICIO DE EXT-02

Fecha:

No.

NOTA 35

FECHA 31-08-22.

SE DA INICIO A TENDIDO DE CARPETA Y BACHEO
EN AV. OCTAVIO PAZ Y AV. LUIS URBINA.
SE APRUEBA EXT. 02.

NOTA 36

FECHA 05-09-22

SE REALIZA VISITA PREVIA EN PARQUE INDUS-
TRIAL CUAUHTEMOC, EN CONJUNTO CON PERSONAL
DE NIRVANA. SE INDICAN CALLES Y DETA-
LLES A ATACAR EN CADA UNA.
SE RECIBE SOLICITUD DE EXT 03

NOTA 37.

FECHA 06-09-22.

SE CIERRA PRIMEROS 2 CUERPOS DE
AV. OCTAVIO PAZ. QUEDANDO PENDIENTE LOS
DETALLES DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE
CASAS DE VALVULAS Y POZOS DE VISITA. SE
SOLICITA INICIAR CON NIVELACION EN
TODAS LAS AV. YA RECARPETEADAS YA QUE
SE ESTA QUEDANDO RETAGADO ESTE PUNTO.
SE RECIBE SOLICITUD DE CONCEPTOS EXCEDENTES.

NOTA 38.

FECHA 07-09-22

SE DA INICIO Y CIERRE DE SEGUNDA AREA.
EN AV. OCTAVIO PAZ GUNDAÑTE CON AV. TECNOLOGO
SE CONCLUYEN BACHEO Y TENDIDO DE
CARPETA ASFALTICA DE 2 CM.

Fecha:

No.

NOTA 39

FECHA 08-09-22.

SE INICIA TENDIDO DE ULTIMA VIALIDAD DE PARQUE CHIHUAHUA EN AV. LUIS G. URBINA.

SE NOS SOLICITA APOYO CON CASAS SECAS Y AUTOS ESTACIONADOS EN EL SITIO, SE ATIENDE EL PUNTO.

SE SOLICITA BACHEAR AREAS NUEVAS PRODUCIDAS POR LLUVIAS EN AV. VICTOR HUGO COINDANTE CON AVENIDAS. NEOLAS GOGOL, HEMINGWAY Y KIPLING, Y DE AV. LUIS G. URBINA. EXISTENTE CON AV. MARIANO AZUELA.

TAMBIEN SE RECUERDA ATACAR DETALLES PENDIENTES EN AV. MIGUEL DE CERVANTES Y AV. KIPLING. LOS DAÑOS CONSISTEN, EN DESPRENDIMIENTO POR TENDIDO POR LLUVIAS Y EN RETORNOS DE AV. INDUSTRIAS.

SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODEH/01/089/2022 DE EXCEDENTES Y OFICIO PRODEH/01/090 BIS/2022.

NOTA 40.

FECHA 12-09-22

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA EN AV. LUIS G. URBINA, SE TIENE PROBLEMA CON AUTOS ESTACIONADOS EN LA ZONA Y SE PIDE DESALOJARLOS. SE RECIBE SOLICITUD DE EXTRAORDINARIO EXT-04 AL EXT-07.

NOTA 41

FECHA 14-09-22.

SE SUSPENDE TRABAJOS HASTA EL DIA 19-09-22 YA QUE SE DA DAÑO MANTENIMIENTO A PLANTA DE ASFALTO Y NO HABRA SUMINISTRO SE PROCEDE CON LIMPEZA DE AREAS.

Fecha:

No.

NOTA 42.

FECHA 19-09-22.

SE CONTINUA EXTENSION DE CARPETA EN AV. LUIS G. URBINA, SE CONCEDE VIALIDAD. SE SOLICITA DAR TERMINO A DETALLES DE LIMPIEZA.

SE INICIA NIVELACION. DE Cajas DE VACUILLAS SE ENTREGA OFICIO PRODECH/01/091 BIS/2022 DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DEL EXT 04 AL EXT 07

NOTA 43

FECHA 20-09-22.

SE SOLICITA IMPREGNAR CON RIEGO DE LIGA EN AV. INDUSTRIAS EN RETORNOS Y MIGUEL DE CERVANTES. YA QUE TRANSITARON CON EL MATERIAL SIN DAR EL TIEMPO A QUE LA CARPETA SEA OXIDADA Y PRESENTE DESGRANAMIENTO.

NOTA 44

FECHA 21-09-22.

SE REALIZA MOVIMIENTO DE MAQUINARIO A PARQUE CUAUHTEMOC, SE CONTINUAN ELABORANDO DETALLES DE NIVELACION DE Cajas DE VACUILLAS Y POZO DE VISITA. Y TOPES. ASI COMO BACHEO.

SE SOLICITA A RICARDO ENCARGADO DE NIQUANA QUE SE CONSERVE LA MISMA CALIDAD DE ASFALTO Y DE TROBADO EN CUAUHTEMOC.

NOTA 45

FECHA 22-09-22.

SE DA RECORRIDO CON CONTRATISTA EN PARQUE CUAUHTEMOC. SE ACUERDA CON PERSONAL DE PROMOTORA COMPACTAR BASE YA QUE LOS BACHES ESTAN MUY EROSIONADOS Y SE TOMARA MATERIAL DE BASE EN PARQUE SOBRIANTE DE OTROS PROYECTOS.

Fecha:

No.

NOTA 46.

FECHA 23-09-22

SE DA INICIO DE EXTENSION DE CARPETA EN CRUCE DE CALLES TEMOSACHIC Y TUTUACA, ESTA AREA SIENDO UN EXTRAORDINARIO.

SE CONTINUA FRANJA SOBRE CALLE TUTUACA. SE INICIA BACHEO EN AV TUTUACA

SE COMENTAN RASGADURAS EN PARQUE CHIHUAHUA EN AV MIGUEL DE CERVANTES LAS CUALES SE PIDE REPARACION.

NOTA 47.

FECHA 24-09-22

-SE SOLICITA REVISION DE MATERIAL ASFALTICO YA QUE EN CARRIL DE BAJA VELOCIDAD AL TENDERIO SE APRECIAN POROS O GRAVA EXPUESTA. SE SOLICITA SE REPAREN DICHS PUNTOS. SE PARA VISITA EL DIA 26-09-22 PARA VERLO FISICAMENTE Y NO FOTOGRAFICAMENTE EN PARQUE CUALTEMOC

NOTA 48

26-09-22

SE REvisa TENDIDO DE CALLE RIO TUTUACA. SE APRECIAN VARIOS PUNTOS CON PIEDRA EXPUESTA Y SE COMENTA QUE LA MEZCLA NO SE PUEDE EXTENDER CON FACILIDAD (PERSONAL DE NIQUANA). LABORATORIO COMENTA QUE LA MEZCLA CUMPLE DENTRO DE PARAMETROS PERO PRESENTA UN COLOR PARDO Y ES DIFICIL EL COMPACTARLA.

-SE ELABORA BACHEO EN RIO SANTA CLARA Y GLORIETA.

Fecha:

No.

NOTA 49

FECHA 28-09-22

SE REUSA BACHEO E INICIO DE TENDIDO EN AV
RIO SANTA CLARA Y SE INDICAN DETALLES
DE GRANO EXPUESTO EL CUAL ES REPETITIVO.
Y EL TRAFICO PESADO TERMINA POR CERRAR
O DESAR BIEN COMPACTO EL CENTRO PERO NO
JUNTO A GUARNICIONES.

NOTA 50

FECHA 30-09-22

SE CONCLUYE TENDIDO DE BACHES Y CARPETA
EN RIO SANTA CLARA Y SE DARA INICIO EN
GLORIETA Y CALLE RIO CHUVISCAR. SE PIDE
TENER REUNION CON LABORATORIO Y ENCAR-
GADO DE NIRVANA. (ING. IVAN ARRIETA) YA
QUE EL ACABADO NO QUEDA CERRADO SE
VISITA PLANTA ASFALTERA Y SE REUSA
MATERIAL DE BANCO A SIMPLE VISTA
PARECEN DE BUENA CALIDAD PERO NO
CESA LOS DETALLES DE TENDIDO.

NOTA 51

03-10-22

SE DA RECORRIDO Y REVISION DE PUNTOS
MAS CRITICOS DE GRANO EXPUESTO. SE
COMENTA QUE LA CALIDAD DE ASFALTO CUMPLE
PERO NO SE EXPLICA EL ACABADO. SE
ACUERDA QUE LO IDEAL ES RIEGO POR ACT
PERO NO SE TIENE EL EQUIPO. SE
SUGIERE EMPLEAR MEZCLA SUPER ESTABLE
PARA TRATAR DE LOGRAR EL ACABADO.
A RESERVA DE QUE FUNCIONE SE
HARAN PRUEBAS EN SITIO.
