

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ CHAVEZ




SUPERVISIÓN

ING. MARIO ALAN CEREAL TORRES



CONTRATISTAS

ING. RUBÉN GALAZ GRILAJA

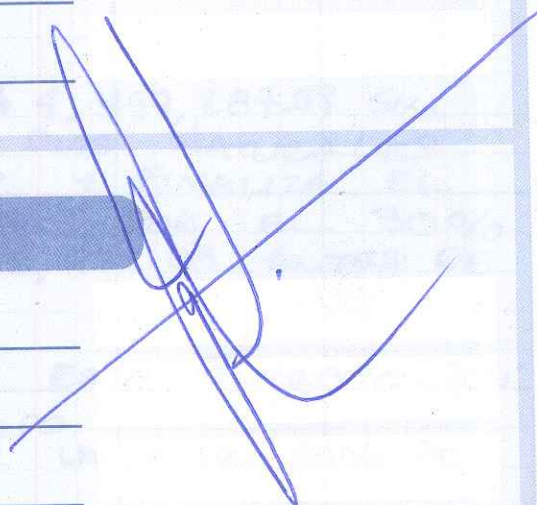

Vo. Bo. COORDINACIÓN

Vo. Bo. SUPERVISIÓN

Vo. Bo. PATRÓN

Fecha: 20-07-2022.

No.

CHIHUAHUA CHIH.

NOTA 1

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PROPIEDAD DEL ORGANISMO CONTRATO DE LICENCIA DE OBRA PUBLICA NUMERO "PRODECH/PIC/04/2022"

LA CUAL CONSISTE EN LA PERFORACION VERTICAL Y ADENE A UNA PROFUNDIDAD DE "N" METROS PARA LA EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, UBICADO EN LA CALLE RIO TUTUACA EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC. LOS TRABAJOS A EFECTUAR ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Y POR EL ING. RUBEN GALAZ GRITALVA COMO ADMINISTRADOR UNICO.

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$ 4,499,287.59 SIN INCLUIR IVA. CON UN PLAZO DE 120 DIAS NATURALES EL CUAL INICIA EL 11/07/2022 Y FINALIZA EL 8/11/2022. SE OTORGA ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO \$ 1,365,752.08 ANTES DE IVA.

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

- GARANTIA POR MONTO DE ANTICIPO
- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL VALOR DEL 10% DE CONTRATO.
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA:

ING. CARLOS GONZALEZ.
TITULAR DPTO ING.
PRODECH.

ING. MARIO CORRAL
SUPERVISOR DE OBRA.
PRODECH

NOTA 2 FECHA: 20/07/2022.

SE DA RECORRIDO CON CONTRATISTA Y SU PERSONAL EN PARQUE CUAUHTEMOC, SE SOLICITA HABILITAR UNA LINEA DE CORRIENTE 110V PARA ILUMINACION YA QUE EL AREA SOLO CUENTA CON 440

LOS EQUIPOS DE PERFORACION LLEGARAN EL DIA 25/07 A SITIO.

SE SOLICITA TOMAR MUESTRAS @ 2MTS DE PERFORACION.

Fecha:

No.

Nota 7

FECHA. 05-08-2022

SE DA REPARACION DE PERFORADOR Y SE REANUDA LA SONDA DE EXPLORACION.

Nota 8

FECHA. 08-08-2022

SE TIENE PERFORADO A 108mts DE SONDA DE EXPLORACION. SE ALMACENAN EN OFICINA DE PROMOTORA LAS PRIMERAS MUESTRAS A INTERVALOS DE 2mts. EN OFICINA DE CUALTENCOC.

Nota 9

FECHA 12-08-2022.

SE PERFORA A 228ml DE SONDO DE EXPLORACION SE SOLICITA REVISION DE CATALOGO YA QUE NO SE INCLUYE CONCEPTO DE RETIRO DE MATERIALES.

Nota 10

FECHA 17-08-2022.

SE PERFORA A 286ml LA CUAL PRESENTO FUGA DE MEZCLA DE BENTONITA. POR MAS DE 160 MIL LITROS DE AGUA. LA CASCUA PODIERA SER RIO O CAVERNA SUBTERRANEA. NO HAY RECUPERACION DE MUESTRAS @ 2mts.

Nota 11

FECHA 18-08-2022

SE INSTALA MEDIDOR DE AGUA DE 1 1/2 DE DIAMETRO PARA SURTIR AGUA. EN POZO 1 YA QUE SE SIGUERA TENIENDO PERDIDAS DE CIRCULACION.
